

Gestão de Projetos

Projeto Integrador IV

Apresentação do Professor

Fabio Xavier de Melo

✓ Doutorado em Engenharia Mecânica (Ruído e Vibrações)

✓ Mestrado em Engenharia Mecânica (Ruído e Vibrações)

✓ Engenheira Física 

✓ Engenharia Mecânica 

✓ Engenharia de Segurança do Trabalho 

✓ Inspetor de Equipamentos FBTS 

✓ Técnico em Química 

✓ Caldeireiro 



O que vamos ver no curso?



- O que é gestão de projetos?
- Case
- Vantagens
- Contexto Histórico
- O que é um projeto?
- O Project Management Institute (PMI)
- O Project Management Body of Knowledge (PMBok)
- Atores da Gestão de Projetos
- Metodologias e Ferramentas
- Gestão Ágil de Projetos

Conteúdo Programático

1. Gerenciamento de projetos

- 1.1. Áreas de gerenciamento de projeto
- 1.2. Processos de Gerenciamento de projetos
- 1.3. Restrição Tripla
- 1.4. Normas técnicas e legislação contratual

2. Planejamento do projeto

- 2.1. Definição do escopo
- 2.2. Entregas
- 2.3. Esforços
- 2.4. Custos
- 2.5. Tempo
- 2.6. Alocação de recursos
- 2.7. Riscos
- 2.8. Ferramentas de gestão de projeto

3. Controle do projeto

- 3.1. Implementação dos planos;
- 3.2. Controle de alterações;
- 3.3. Monitoramento do processo;
- 3.4. Finalização do projeto.

4. Ferramentas ágeis

- 4.1. Scrum
- 4.2. Kanban

Critérios de Avaliação

COMPOSIÇÃO DA NOTA	
55%	Avaliação Docente
35%	Projeto Integrador
10%	Autoavaliação



Avaliação Docente	
X%	Avaliação Continuada
Y%	Avaliação Formato ENADE

Datas Importantes

Semana	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
1	03/ago	04/ago	05/ago	06/ago	07/ago
2	10/ago	11/ago	12/ago	13/ago	14/ago
3	17/ago	18/ago	19/ago	20/ago	21/ago
4	24/ago	25/ago	26/ago	27/ago	28/ago
5	31/ago	01/set	02/set	03/set	04/set
6	22/ago	08/set	09/set	10/set	11/set
7	14/set	15/set	16/set	17/set	18/set
8	21/set	22/set	23/set	24/set	25/set
9	28/set	29/set	30/set	01/out	02/out
10	05/out	06/out	07/out	08/out	09/out
11	19/set	24/out	14/out	15/out	16/out
12	19/out	20/out	21/out	22/out	23/out
13	26/out	27/out	28/out	29/out	30/out
14	07/nov	03/nov	04/nov	05/nov	06/nov
15	09/nov	10/nov	11/nov	12/nov	13/nov
16	16/nov	17/nov	18/nov	19/nov	05/dez
17	23/nov	24/nov	25/nov	26/nov	27/nov
18	30/nov	01/dez	02/dez	03/dez	04/dez
19	07/dez	08/dez	09/dez	10/dez	11/dez
20	14/dez	15/dez	16/dez	17/dez	18/dez

Dia a ser compensado	Sábados Letivos
07/set	22/ago
12/out	19/set
13/out	24/out
02/nov	07/nov
20/nov	05/dez

03/08 - Início do período letivo

12/08 - Entrega dos planos de ensino

24/08 a 28/08 - Definição dos projetos de extensão universitária

10/09 - Simulado ENADE

28/09 a 09/10 - Avaliação P1 (Provas)

14/10 a 16/10 - Semana tecnológica

19/10 a 23/10 - Pesquisa da CPA 2026.2

03/11 a 19/11 - PROVEI (Apenas turmas concluintes)

29/11 - ENADE oficial

30/11 a 04/12 - Avaliação P2 (Provas)

30/11 a 04/12 - Auto Avaliação Discente


30/11 a 04/12 - Semana para conclusão do Projeto Integrador

05/12 (sábado letivo) - Congresso UniSENAI / Extensão

07/12 - 2º Inova+ / Avaliação dos Projetos Integradores

08/12 - Liberação para Encerramento Portal

18/12 - Término do período letivo

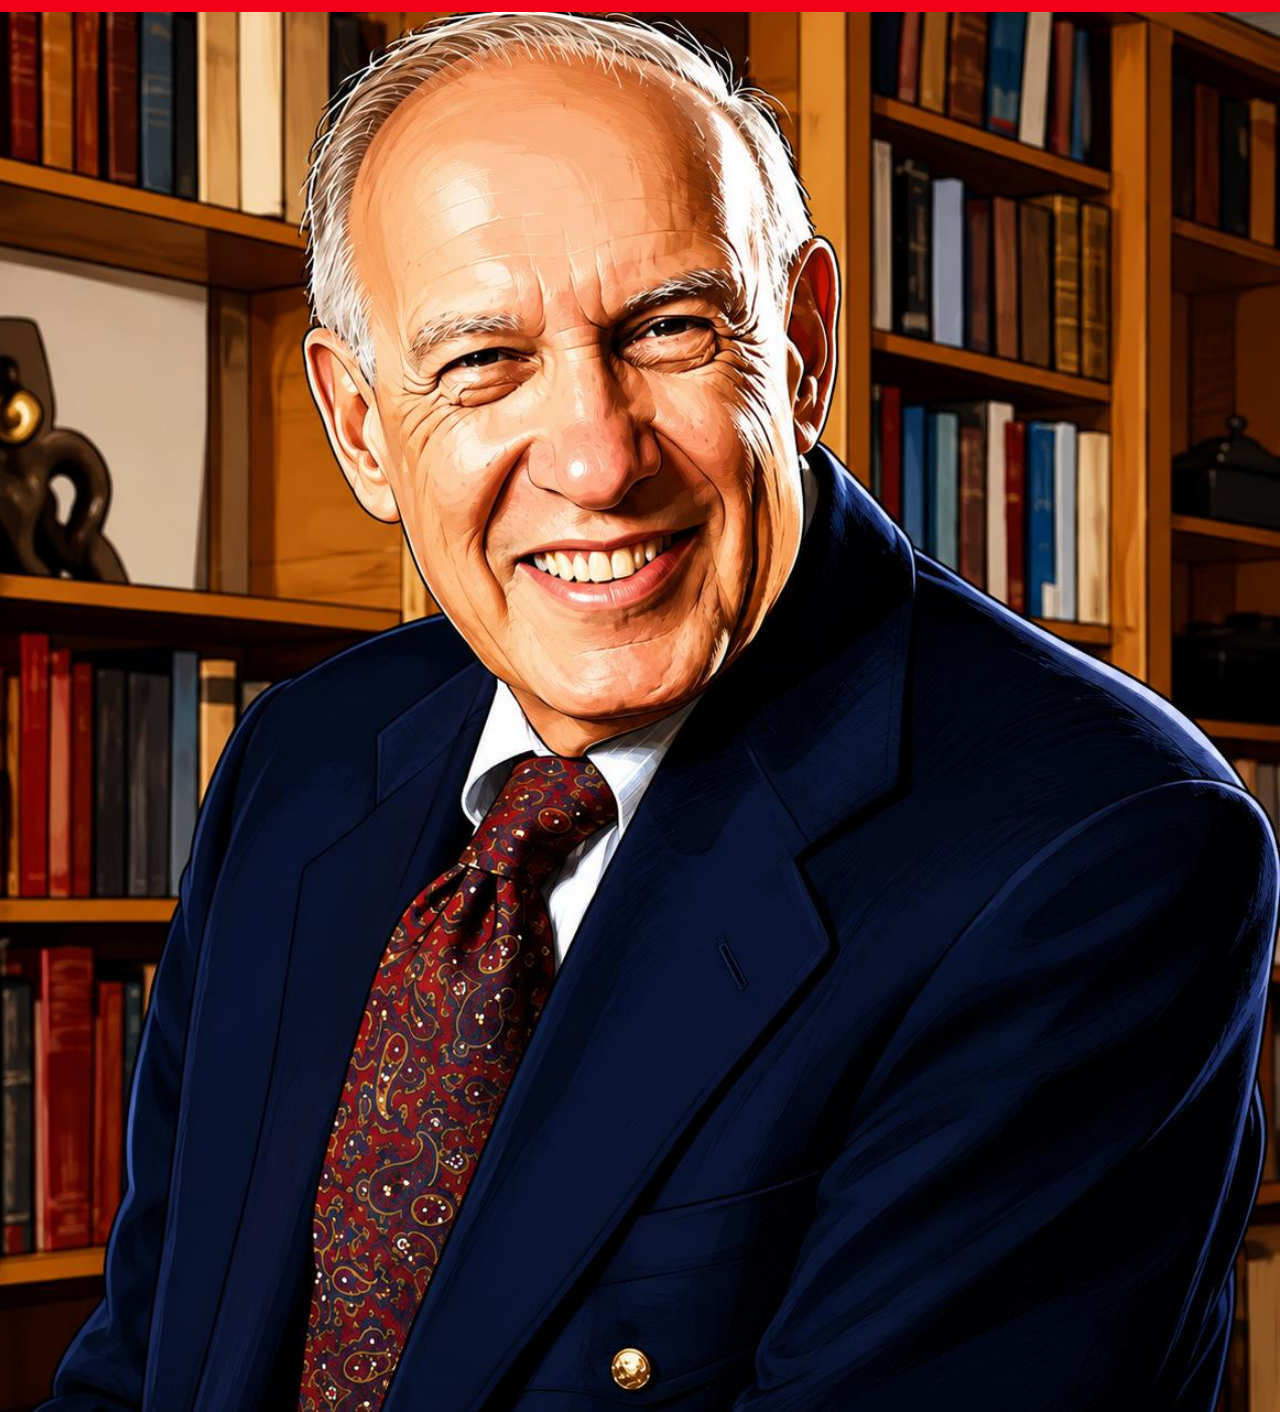

“Maestros não sabem como o oboé faz o seu trabalho, mas eles sabem com o que o oboé deve contribuir.”

PETER DRUCKER

O que é Gestão de Projetos?

Gestão de projetos é o conjunto de conhecimentos, habilidades, técnicas e ferramentas utilizadas para planejar, executar e monitorar um projeto.



E o que é um Projeto?



Um projeto é um conjunto de atividades com início, meio e fim, que visa uma entrega única.


O que é Gestão de Projetos?

As atividades da gestão de projetos incluem:

- A elaboração e o detalhamento do escopo;
- A organização dos recursos humanos, financeiros e materiais;
- A montagem do cronograma e do registro dos custos;
- O monitoramento dos riscos associados ao projeto.



Por que Gerenciar projetos?



Redução de custos;



Otimização do tempo;



Resultados assertivos;



Controle de riscos;




Maior engajamento da equipe.



Por que Gerenciar projetos?



Como o cliente explicou...



Como o líder de projeto entendeu...




Como o analista projetou...



Como o programador construiu...




Como o Consultor de Negócios descreveu...




Como o projeto foi documentado...



Que funcionalidades foram instaladas...



Como o cliente foi cobrado...




Como foi mantido...




O que o cliente realmente queria...

Onde aplicamos o gerenciamento de projetos?

Obras de engenharia;



Elaboração
de serviços;




Desenvolvimento
de produtos;


Projetos Adaptativos vs. Projetos Preditivos




Projetos adaptativos



Preditivos




Ágeis



Projetos tradicionais

Case

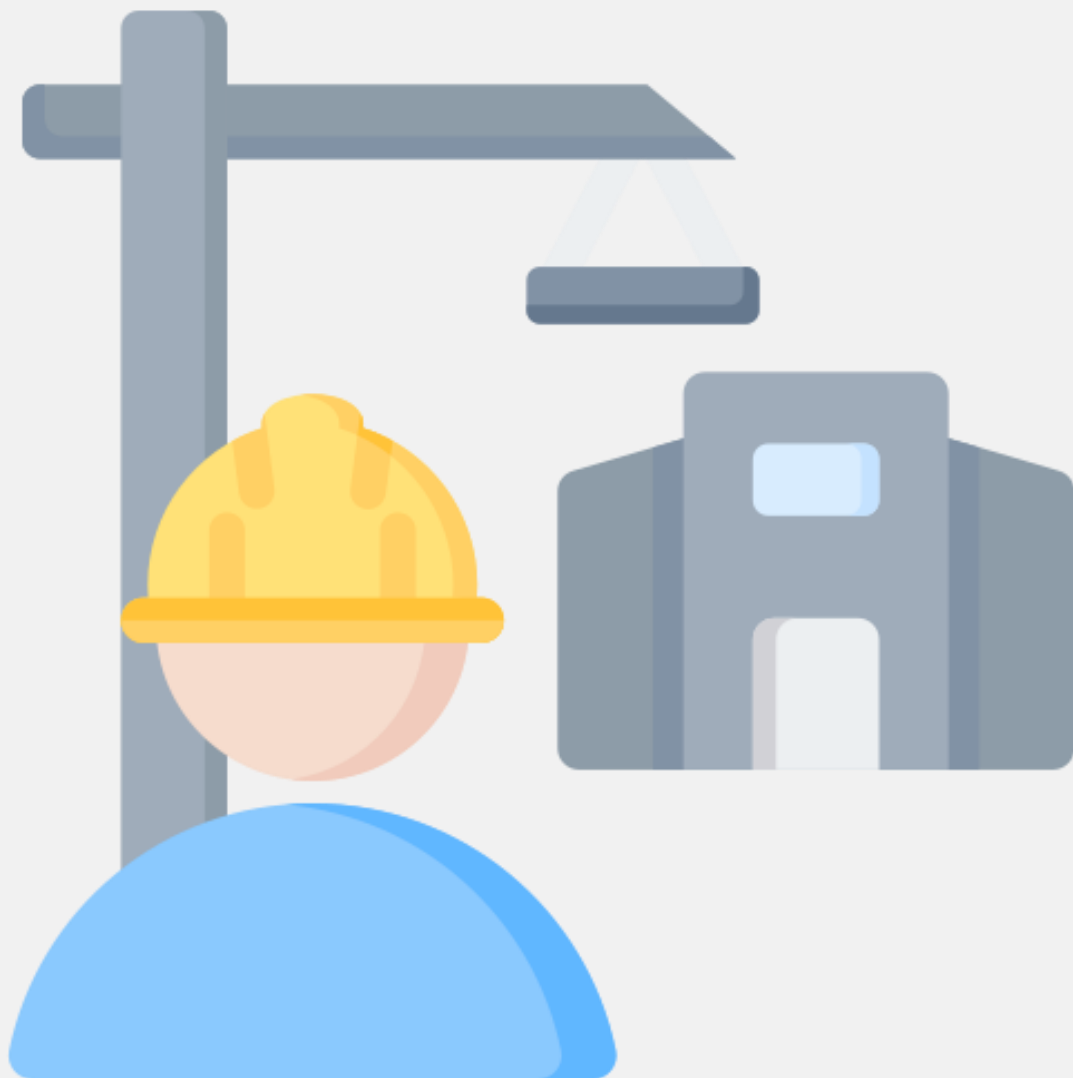

Contexto

Um construtor viu seu negócio de família crescer exponencialmente nos últimos anos.

Porém, apesar da experiência e de possuir mais de 30 anos trabalhando em construções e reformas de casas, os ganhos financeiros não estavam crescendo de acordo como imaginado.

Contexto

Preocupado com o futuro do seus negócios, o construtor, após uma palestra sobre empreendedorismo, resolveu procurar saber mais sobre gerenciamento de projetos. Então, ele decidiu contratar um consultor para lhe auxiliar.



A construtora

O consultor estudou o sistema de produção do negócio, que consistia em:

- Empresa familiar comandada pelo pai e seus dois filhos
- A empresa já estava na terceira geração da família





A construtora

Além disso, outras informações que recolheu recolheu foram:

- A construtora reforma e constrói casas de médio padrão
- O retorno financeiro da construtora é de até 6% por unidade construída.

O diagnóstico

O consultor percebeu que com uma boa gestão de projetos a margem de lucro do negócio poderia chegar a 15%.





O Problema

- Mão de obra parada;
- Problema de estoque;
- Atrasos nas entregas;
- Clientes insatisfeitos;
- Perdas de materiais;
- Constante retrabalho.

A solução

- A solução foi nomear um gestor de projetos responsável pela implantação de melhorias;
- Estruturação bem definida do novo projeto.




Estruturação do novo projeto



Passos:

1. Estruturação da EAP;
2. Uso de metodologias tradicionais;
3. Planejamento do projeto;
4. Gerenciamento do projeto;
5. Controle de orçamento, cronograma, mão de obra.

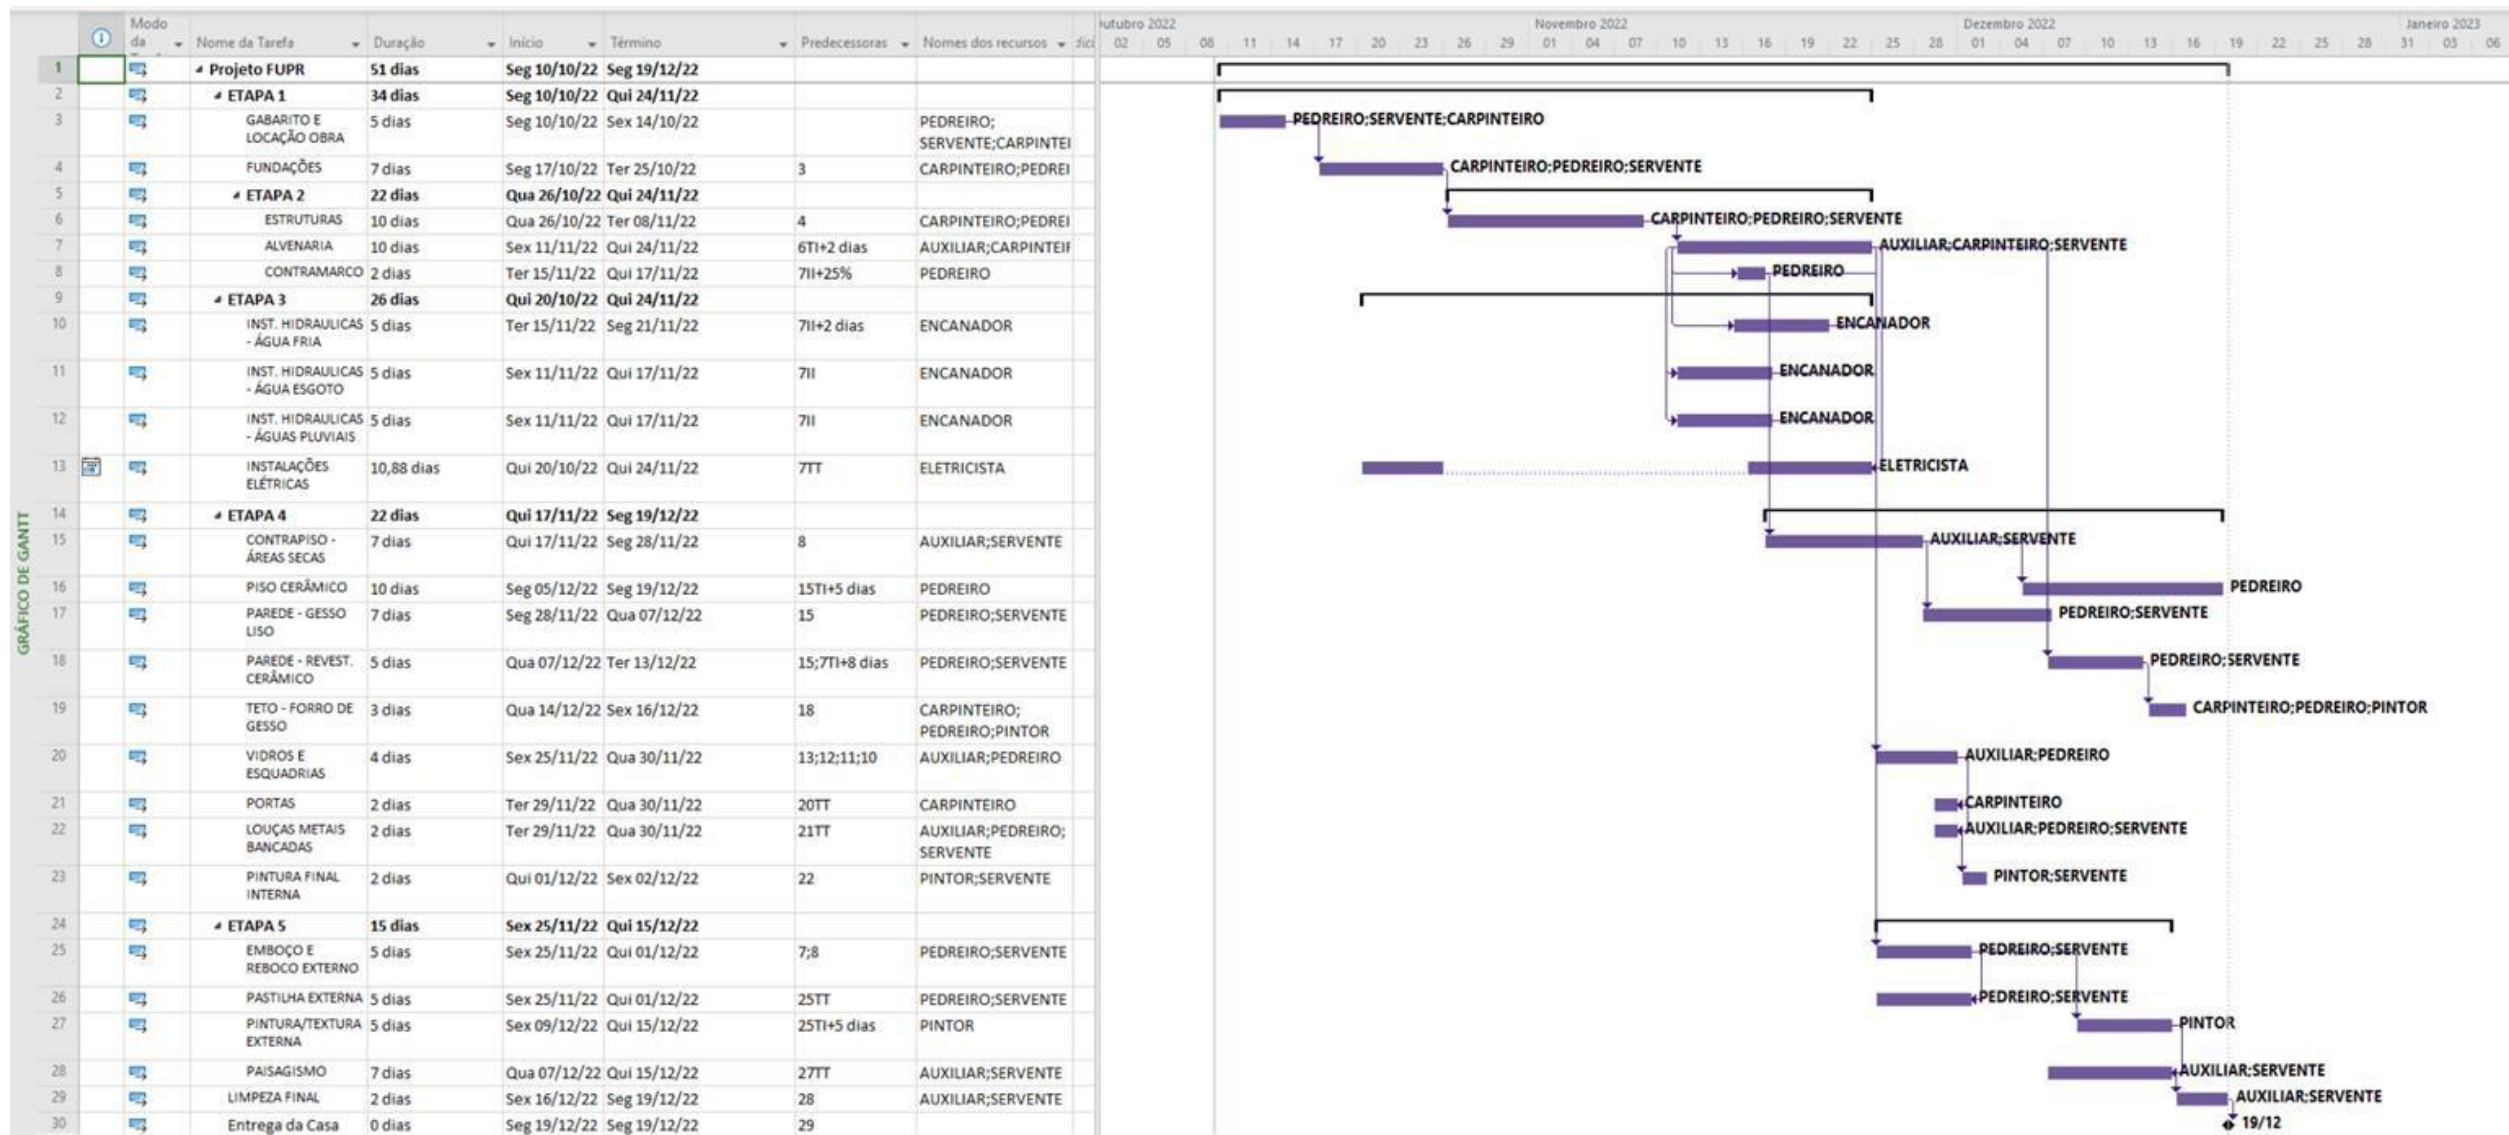

Por que usar o Gerenciamento de Projetos?

Vantagens para a empresa:

- Economia de recursos;
- Aumento da produtividade e engajamento;
- Aumento da eficácia das equipes;
- Alinhamento de comunicação entre os envolvidos;
- Maior satisfação dos clientes.





Por que usar o Gerenciamento de Projetos?

Vantagens para o profissional:

- Melhor controle das etapas;
- Melhor entendimento dos cumprimento dos prazos;
- Redução de riscos;
- Eficiência na hora de tomar decisões;


História do Gerenciamento de Projetos

A história do gerenciamento de projetos nasce com as grandes construções:

- Pirâmides do Egito;
- Aquedutos (*Aqua Appia*);
- Muralha da China;
- Entre outros.



Evolução temporal do tema

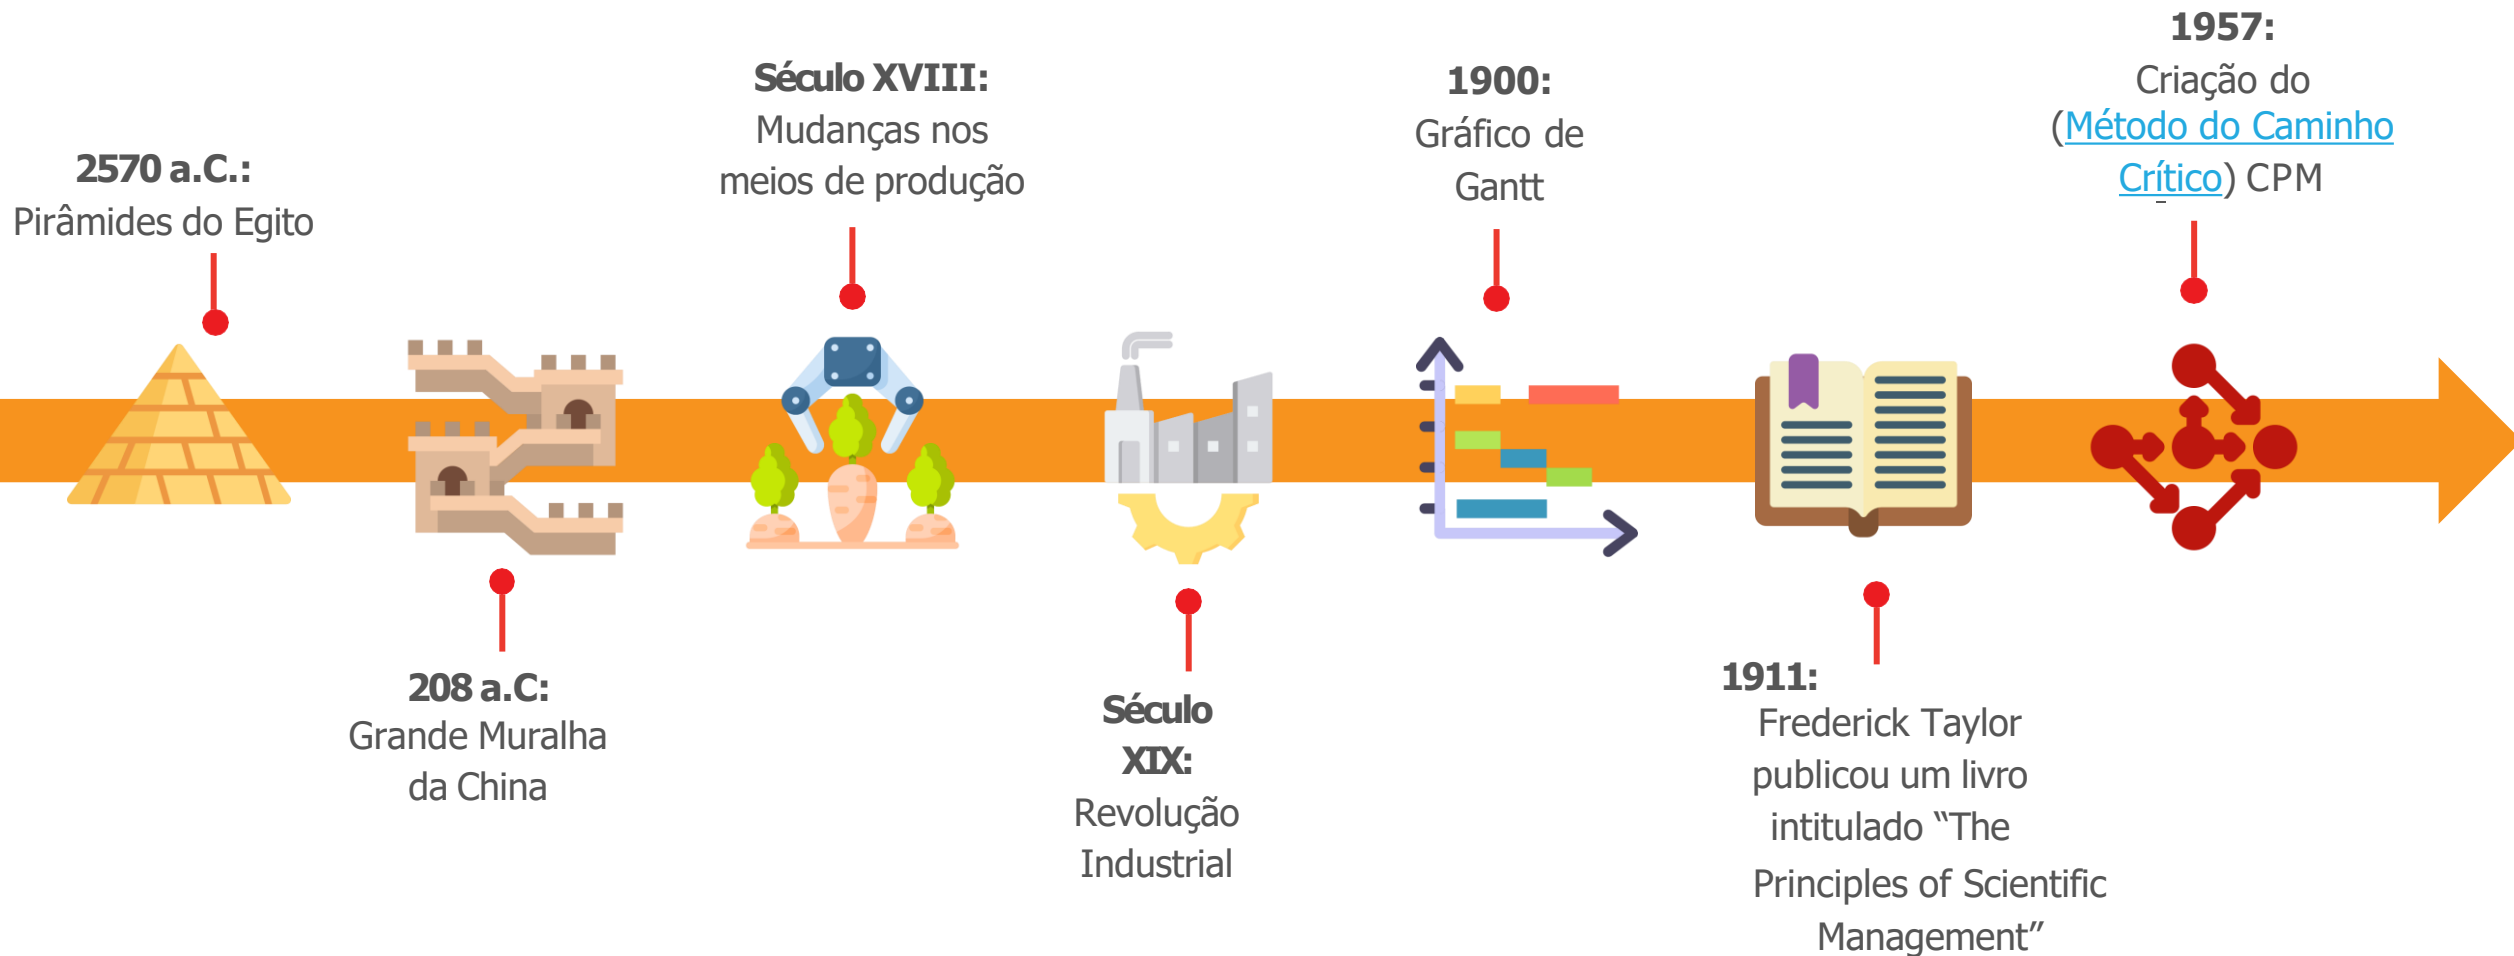

Evolução temporal do tema

1958:

Criação da rede PERT/CPM (Critical Path Method (CPM) e a Program Evaluation and Review Technique (PERT).

1965:

Primeira associação de gestão de projetos do mundo (A IPMA - International Project Management Associate)

1969:

Apollo 11 - Missão espacial realizada pela Nasa que resultou na chegada do homem à Lua.

2001:

Manifesto ágil

1962:

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos (DOD) criou o conceito WBS (Work Breakdown Structure ou EAP)

1969:

Fundação da PMI (Project Management Institute)

1975:

O desenvolvimento da PROMPTII

História do Gerenciamento de Projetos



- A igreja também teve um papel importante em termos de hierarquização;



- O maior salto em termos de gestão ocorreu durante as duas grandes guerras.

Contexto Atual



- Ferramentas que auxiliam no gerenciamento;



- Informática;



- Metodologias ágeis;



- Estatística preditiva.

Porque estudar Gestão de Projetos



Plano de Carreira



Profissional
atrativo, que se
destaque



Novas
oportunidades




Lifelong learning

Porque começar o Plano de Desenvolvimento

O Plano irá contribuir com seus objetivos profissionais.

Ele irá ajudar em cada passo da sua jornada de desenvolvimento profissional.

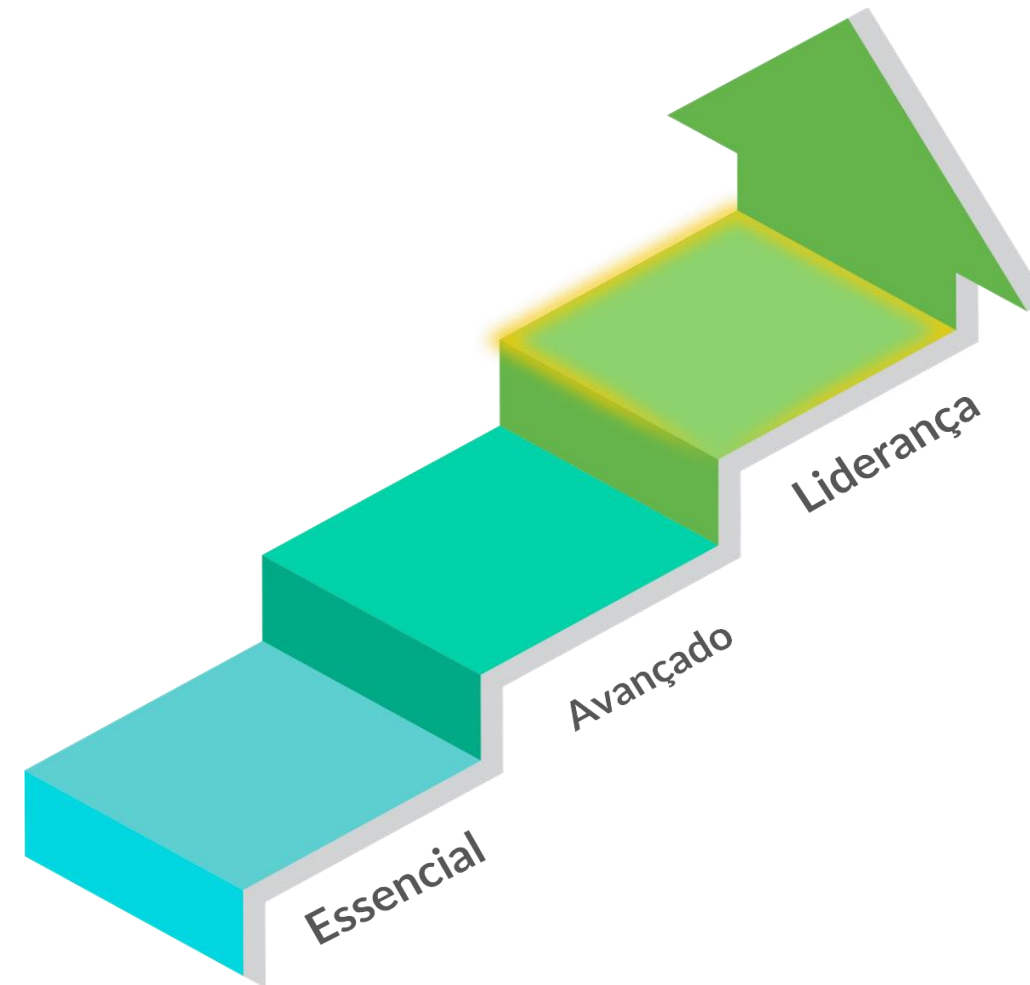



- **Essencial**



- **Avançado**



- **Liderança**

O bom profissional da Gestão de Projetos

Segundo a pesquisa das vagas na Área de Projetos, o mercado de trabalho procura diferentes habilidades do profissional:

As habilidades essenciais



1. Conhecer os principais conceitos e as áreas de conhecimento para realizar projetos;



2. Garantir a execução de todas as atividades do projeto no prazo determinado;



3. Comunicar-se de maneira eficaz e clara;



4. Organizar o próprio trabalho e o trabalho dos membros envolvidos na equipe de projetos;



5. Garantir a correta produção e organização documental de todos os projetos em andamento;



6. Saber analisar criticamente dados, indicadores, processos e a estratégia da empresa;




7. Resolver problemas e melhorar continuamente a maneira com que a empresa realiza seus projetos;




8. Manejar softwares e ferramentas da gestão de projetos de forma proficiente.

As habilidades avançadas



1. Planejar projetos, estimando e orçando os custos, criando e detalhando cronogramas, avaliando critérios de sucesso e os riscos do projeto;
2. Promover um excelente relacionamento pessoal com as várias áreas da empresa;
3. Saber planejar, negociar, produzir e gerenciar contratos referentes ao projeto;
4. Dar suporte aos clientes do projeto, resolvendo seus problemas e garantindo uma excelente visibilidade do que está acontecendo;
5. Controlar rigorosamente os prazos e o desempenho financeiro do projeto;
6. Ter uma excelente capacidade analítica, de resolução de problemas e de melhoria contínua;
7. Identificar, negociar e gerenciar possíveis alterações no escopo do projeto;
8. Possuir amplo conhecimento em metodologias ágeis (Scrum, Design Thinking, etc.);
9. Criar e gerenciar relatórios visuais para a apresentação de indicadores.

As habilidades de Liderança



1. Coordenar equipes a fim de garantir a execução de todas as atividades da área de projetos;
2. Gerenciar pessoas, garantindo que todos estejam alinhados com a estratégia da empresa;
3. Gerenciar os custos e o budget da área de projetos;
4. Selecionar e promover projetos estratégicos dentro da empresa, garantindo a sua execução;
5. Gerenciar conflitos com clientes, fornecedores e colaboradores;
6. Gerir estrategicamente o plano de desenvolvimento dos membros da área de projetos.

Projeto Integrador

4º Semestre

Cibersegurança



Espera-se que os alunos apliquem os conceitos de cibersegurança para identificar vulnerabilidades na API do projeto integrador, avaliar seus impactos, realizar testes de exploração de forma ética e propor mecanismos de mitigação, incorporando princípios de desenvolvimento seguro ao ciclo de construção da aplicação.

Desenvolvimento Mobile



Na disciplina de Desenvolvimento Mobile, busca-se desenvolver a competência na construção de aplicações mobile, abrangendo design de layouts responsivos, gerenciamento persistente de dados locais, integração com serviços web, captura de mídia e recursos de geolocalização, integrando essas funcionalidades para o projeto integrador do 4º. semestre.

Chatbot



Os alunos deverão desenvolver um agente conversacional (chatbot) capaz de responder a perguntas relacionadas ao contexto do Projeto Integrador. O chatbot poderá abordar dúvidas gerais sobre a empresa utilizada no projeto ou um tema específico relacionado à solução desenvolvida pelo grupo.

Além da implementação do agente, os alunos deverão apresentar uma demonstração prática de seu funcionamento, utilizando as ferramentas e tecnologias estudadas ao longo da disciplina.

Aplicações Web



Na disciplina de Aplicações Web, busca-se desenvolver a competência na construção de aplicações web completas, abrangendo o desenvolvimento de APIs REST, a persistência de dados em banco de dados relacional, a containerização de serviços com Docker, o controle de versão colaborativo com Git e GitHub, e o processo de deploy da aplicação, integrando essas funcionalidades para o projeto integrador do 4º semestre.

Exemplo EAP

